New Roundabouts, Higham Common Rd & Barugh Green Rd (Rev 1)

STRATA STERLING BARNSLEY WEST

24/11/21
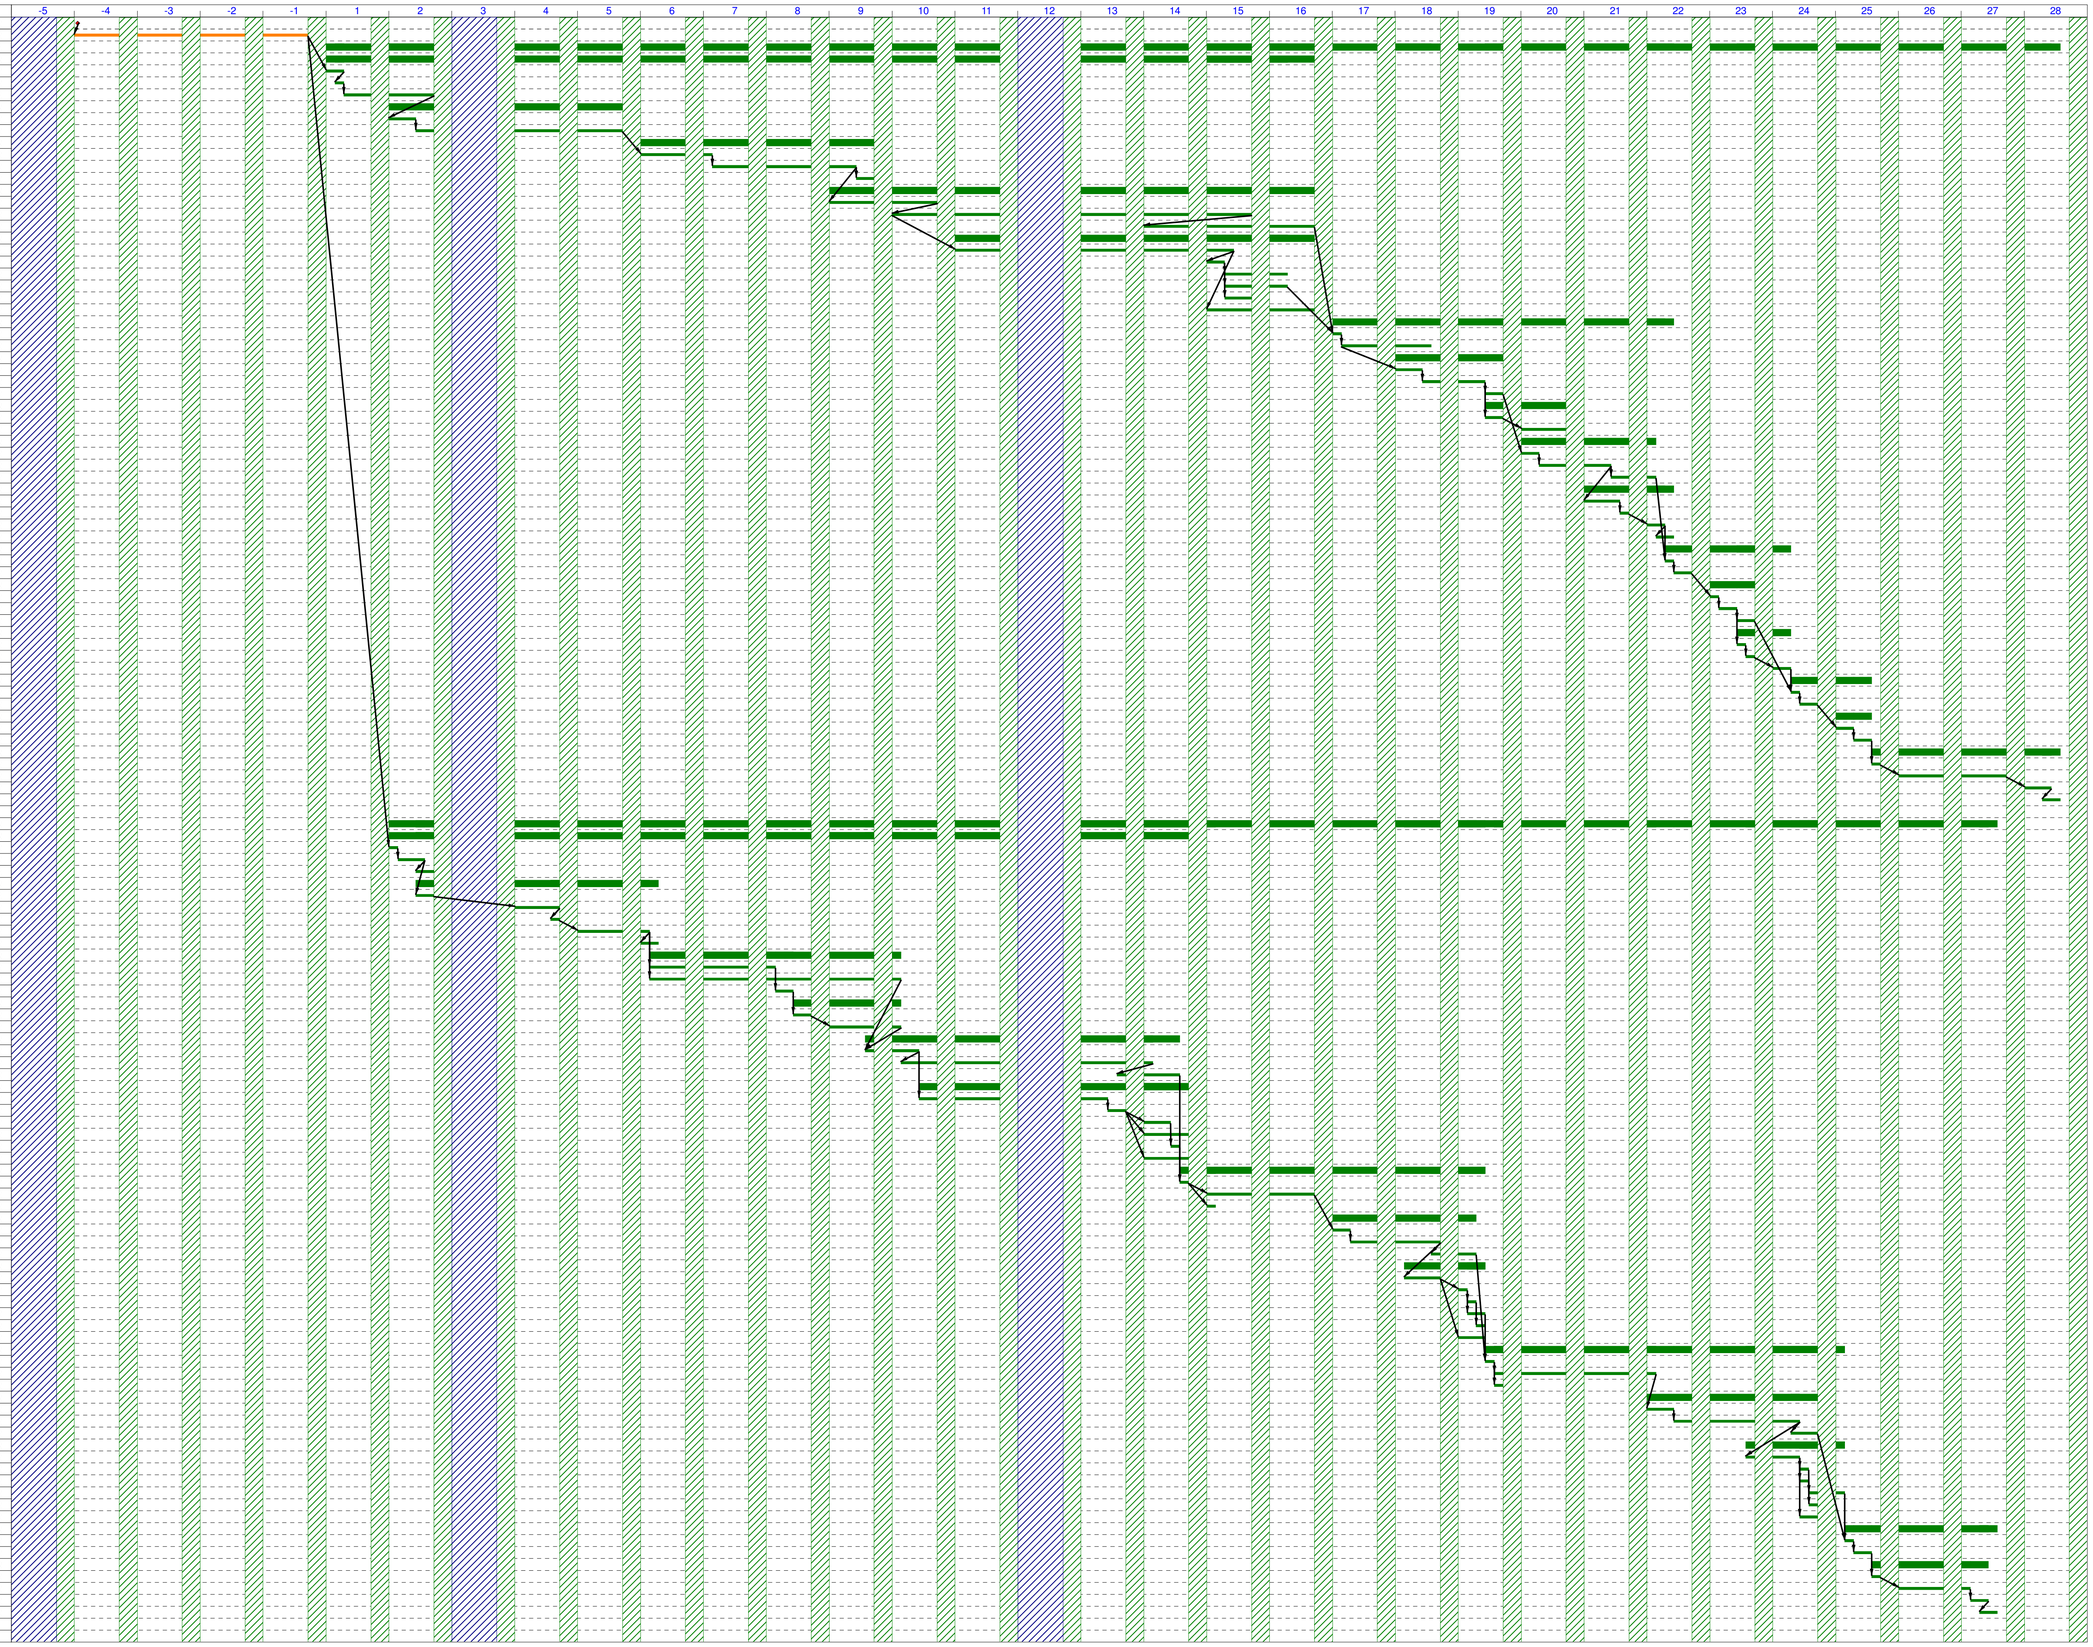
ID	Name	Start	Duration	Finish
1	Notice of Award	03/01/22	0d	03/01/22
2	Mobilisation	03/01/22	20d	28/01/22
3	High Common Road	31/01/22	129d	11/08/22
4	Area 1	**31/01/22**	**70d**	**20/05/22**
5	Site Establishment	31/01/22	2d	01/02/22
6	Traffic Management	01/02/22	1d	01/02/22
7	Site Clearance	02/02/22	8d	11/02/22
8	**Earthworks**	**07/02/22**	**15d**	**04/03/22**
9	Topsoil	07/02/22	3d	09/02/22
10	Cut/Fill	10/02/22	12d	04/03/22
11	**Surface Water Drainage**	**07/03/22**	**20d**	**01/04/22**
12	Manholes - 2G	07/03/22	6d	14/03/22
13	Pipework - 2G	15/03/22	12d	30/03/22
14	Gullys	31/03/22	2d	01/04/22
15	**Road Construction**	**28/03/22**	**35d**	**20/05/22**
16	Type 1 Sub-base	28/03/22	10d	08/04/22
17	Kerbs/Channels - 2G	04/04/22	25d	13/05/22
18	Tarmac	02/05/22	15d	20/05/22
19	**Footpath/RAB border**	**11/04/22**	**25d**	**20/05/22**
20	Edging	11/04/22	18d	11/05/22
21	Type 1 Sub-base	09/05/22	2d	10/05/22
22	Block Paving	11/05/22	5d	17/05/22
23	Tarmac	11/05/22	5d	17/05/22
24	Tactiles	11/05/22	3d	13/05/22
25	Grass Verge	09/05/22	10d	20/05/22
26	**Area 2**	**23/05/22**	**28d**	**29/06/22**
27	Traffic Management	23/05/22	1d	23/05/22
28	Site Clearance	24/05/22	8d	02/06/22
29	**Attenuation Tank**	**30/05/22**	**10d**	**10/06/22**
30	Excavation & Preparation	30/05/22	3d	01/06/22
31	Installation	02/06/22	5d	08/06/22
32	Backfill	09/06/22	2d	10/06/22
33	**Surface Drainage**	**09/06/22**	**7d**	**17/06/22**
34	Gullys & Manholes	09/06/22	2d	10/06/22
35	Pipework	13/06/22	5d	17/06/22
36	**Road Construction**	**13/06/22**	**11d**	**27/06/22**
37	Type 1 Sub-base	13/06/22	2d	14/06/22
38	Kerbs/Channels	15/06/22	6d	22/06/22
39	Tarmac	23/06/22	3d	27/06/22
40	**Footpath**	**20/06/22**	**8d**	**29/06/22**
41	Edging	20/06/22	4d	23/06/22
42	Type 1 Sub-base	24/06/22	1d	24/06/22
43	Tarmac	27/06/22	2d	28/06/22
44	Grass Verge	28/06/22	2d	29/06/22
45	**Area 3**	**29/06/22**	**10d**	**12/07/22**
46	Traffic Management	29/06/22	1d	29/06/22
47	Site Clearance	30/06/22	2d	01/07/22
48	**Road Construction**	**04/07/22**	**5d**	**08/07/22**
49	Type 1 Sub-base	04/07/22	1d	04/07/22
50	Kerbs/Channels	05/07/22	2d	06/07/22
51	Tarmac	07/07/22	2d	08/07/22
52	**Footpaths**	**07/07/22**	**4d**	**12/07/22**
53	Edgings	07/07/22	1d	07/07/22
54	Type 1 Sub-base	08/07/22	1d	08/07/22
55	Tarmac	11/07/22	2d	12/07/22
56	**Area 4**	**13/07/22**	**7d**	**21/07/22**
57	Traffic Management	13/07/22	1d	13/07/22
58	Site Clearance	14/07/22	2d	15/07/22
59	**Road Construction**	**18/07/22**	**4d**	**21/07/22**
60	Type 1 Sub-base	18/07/22	2d	19/07/22
61	Tarmac	20/07/22	2d	21/07/22
62	**Area 5**	**22/07/22**	**15d**	**11/08/22**
63	Traffic Management	22/07/22	1d	22/07/22
64	Surfacing	25/07/22	10d	05/08/22
65	Road Marking	08/08/22	3d	10/08/22
66	Clear Site & Snags	10/08/22	2d	11/08/22
67				
68	**Barugh Green Road**	**07/02/22**	**119d**	**04/08/22**
69	**Area 1**	**07/02/22**	**55d**	**06/05/22**
70	Site Establishment	07/02/22	1d	07/02/22
71	Site Clearance	08/02/22	3d	10/02/22
72	Excavate footpath & kerbs	10/02/22	2d	11/02/22
73	**Earthworks**	**10/02/22**	**14d**	**08/03/22**
74	Topsoil	10/02/22	2d	11/02/22
75	Cut/Fill	21/02/22	5d	25/02/22
76	Trial Holes	25/02/22	1d	25/02/22
77	Turnover	28/02/22	6d	07/03/22
78	Geogrid Stitching	07/03/22	2d	08/03/22
79	**Surface Drainage**	**08/03/22**	**20d**	**04/04/22**
80	Manholes	08/03/22	10d	21/03/22
81	Pipework	08/03/22	20d	04/04/22
82	Gullys	22/03/22	2d	23/03/22
83	**Foul Drainage**	**24/03/22**	**8d**	**04/04/22**
84	Manholes	24/03/22	2d	25/03/22
85	Pipework	28/03/22	6d	04/04/22
86	**Road Construction**	**01/04/22**	**20d**	**05/05/22**
87	Type 1 Sub-base	01/04/22	4d	06/04/22
88	Kerbs/Channels	05/04/22	15d	02/05/22
89	Tarmac	29/04/22	5d	05/05/22
90	**Footpath/RAB border**	**07/04/22**	**17d**	**06/05/22**
91	Edging	07/04/22	10d	27/04/22
92	Type 1 Sub-base	28/04/22	2d	29/04/22
93	Block Paving	02/05/22	3d	04/05/22
94	Tarmac	02/05/22	5d	06/05/22
95	Tactiles	05/05/22	1d	05/05/22
96	Grass Verge	02/05/22	5d	06/05/22
97	**Area 2**	**06/05/22**	**24d**	**08/06/22**
98	Traffic Management	06/05/22	1d	06/05/22
99	Site Clearance	09/05/22	10d	20/05/22
100	Surface Drainage	09/05/22	1d	09/05/22
101	**Road Construction**	**23/05/22**	**12d**	**07/06/22**
102	Type 1 Sub-base	23/05/22	2d	24/05/22
103	Kerbs/Channels	25/05/22	8d	03/06/22
104	Tarmac	03/06/22	3d	07/06/22
105	**Footpath/RAB border**	**31/05/22**	**7d**	**08/06/22**
106	Edging	31/05/22	4d	03/06/22
107	Type 1 Sub-base	06/06/22	1d	06/06/22
108	Block Paving	07/06/22	1d	07/06/22
109	Tarmac	07/06/22	2d	08/06/22
110	Tactiles	08/06/22	1d	08/06/22
111	Grass Verge	06/06/22	3d	08/06/22
112	**Area 3**	**09/06/22**	**28d**	**18/07/22**
113	Traffic Management	09/06/22	1d	09/06/22
114	Site Clearance	10/06/22	12d	27/06/22
115	Surface Drainage	10/06/22	1d	10/06/22
116	**Road Construction**	**27/06/22**	**15d**	**15/07/22**
117	Type 1 Sub-base	27/06/22	3d	29/06/22
118	Kerbs/Channels	30/06/22	10d	13/07/22
119	Tarmac	13/07/22	3d	15/07/22
120	**Footpath/RAB border**	**08/07/22**	**7d**	**18/07/22**
121	Edging	08/07/22	4d	13/07/22
122	Type 1 Sub-base	14/07/22	1d	14/07/22
123	Block Paving	14/07/22	1d	14/07/22
124	Tarmac	15/07/22	2d	18/07/22
125	Tactiles	15/07/22	1d	15/07/22
126	Grass Verge	14/07/22	2d	15/07/22
127	**Area 4**	**19/07/22**	**13d**	**04/08/22**
128	Traffic Management	19/07/22	1d	19/07/22
129	Site Clearance	20/07/22	2d	21/07/22
130	**Road Construction**	**22/07/22**	**9d**	**03/08/22**
131	Type 1 Sub-base	22/07/22	1d	22/07/22
132	Tarmac	25/07/22	6d	01/08/22
133	Road Lining	02/08/22	2d	03/08/22
134	Clear Site & Snags	03/08/22	2d	04/08/22
135				
136
