New Roundabouts
Higham Common Rd & Barugh Green Rd (Rev 1a)

STRATA STERLING BARNSLEY WEST

16/08/23
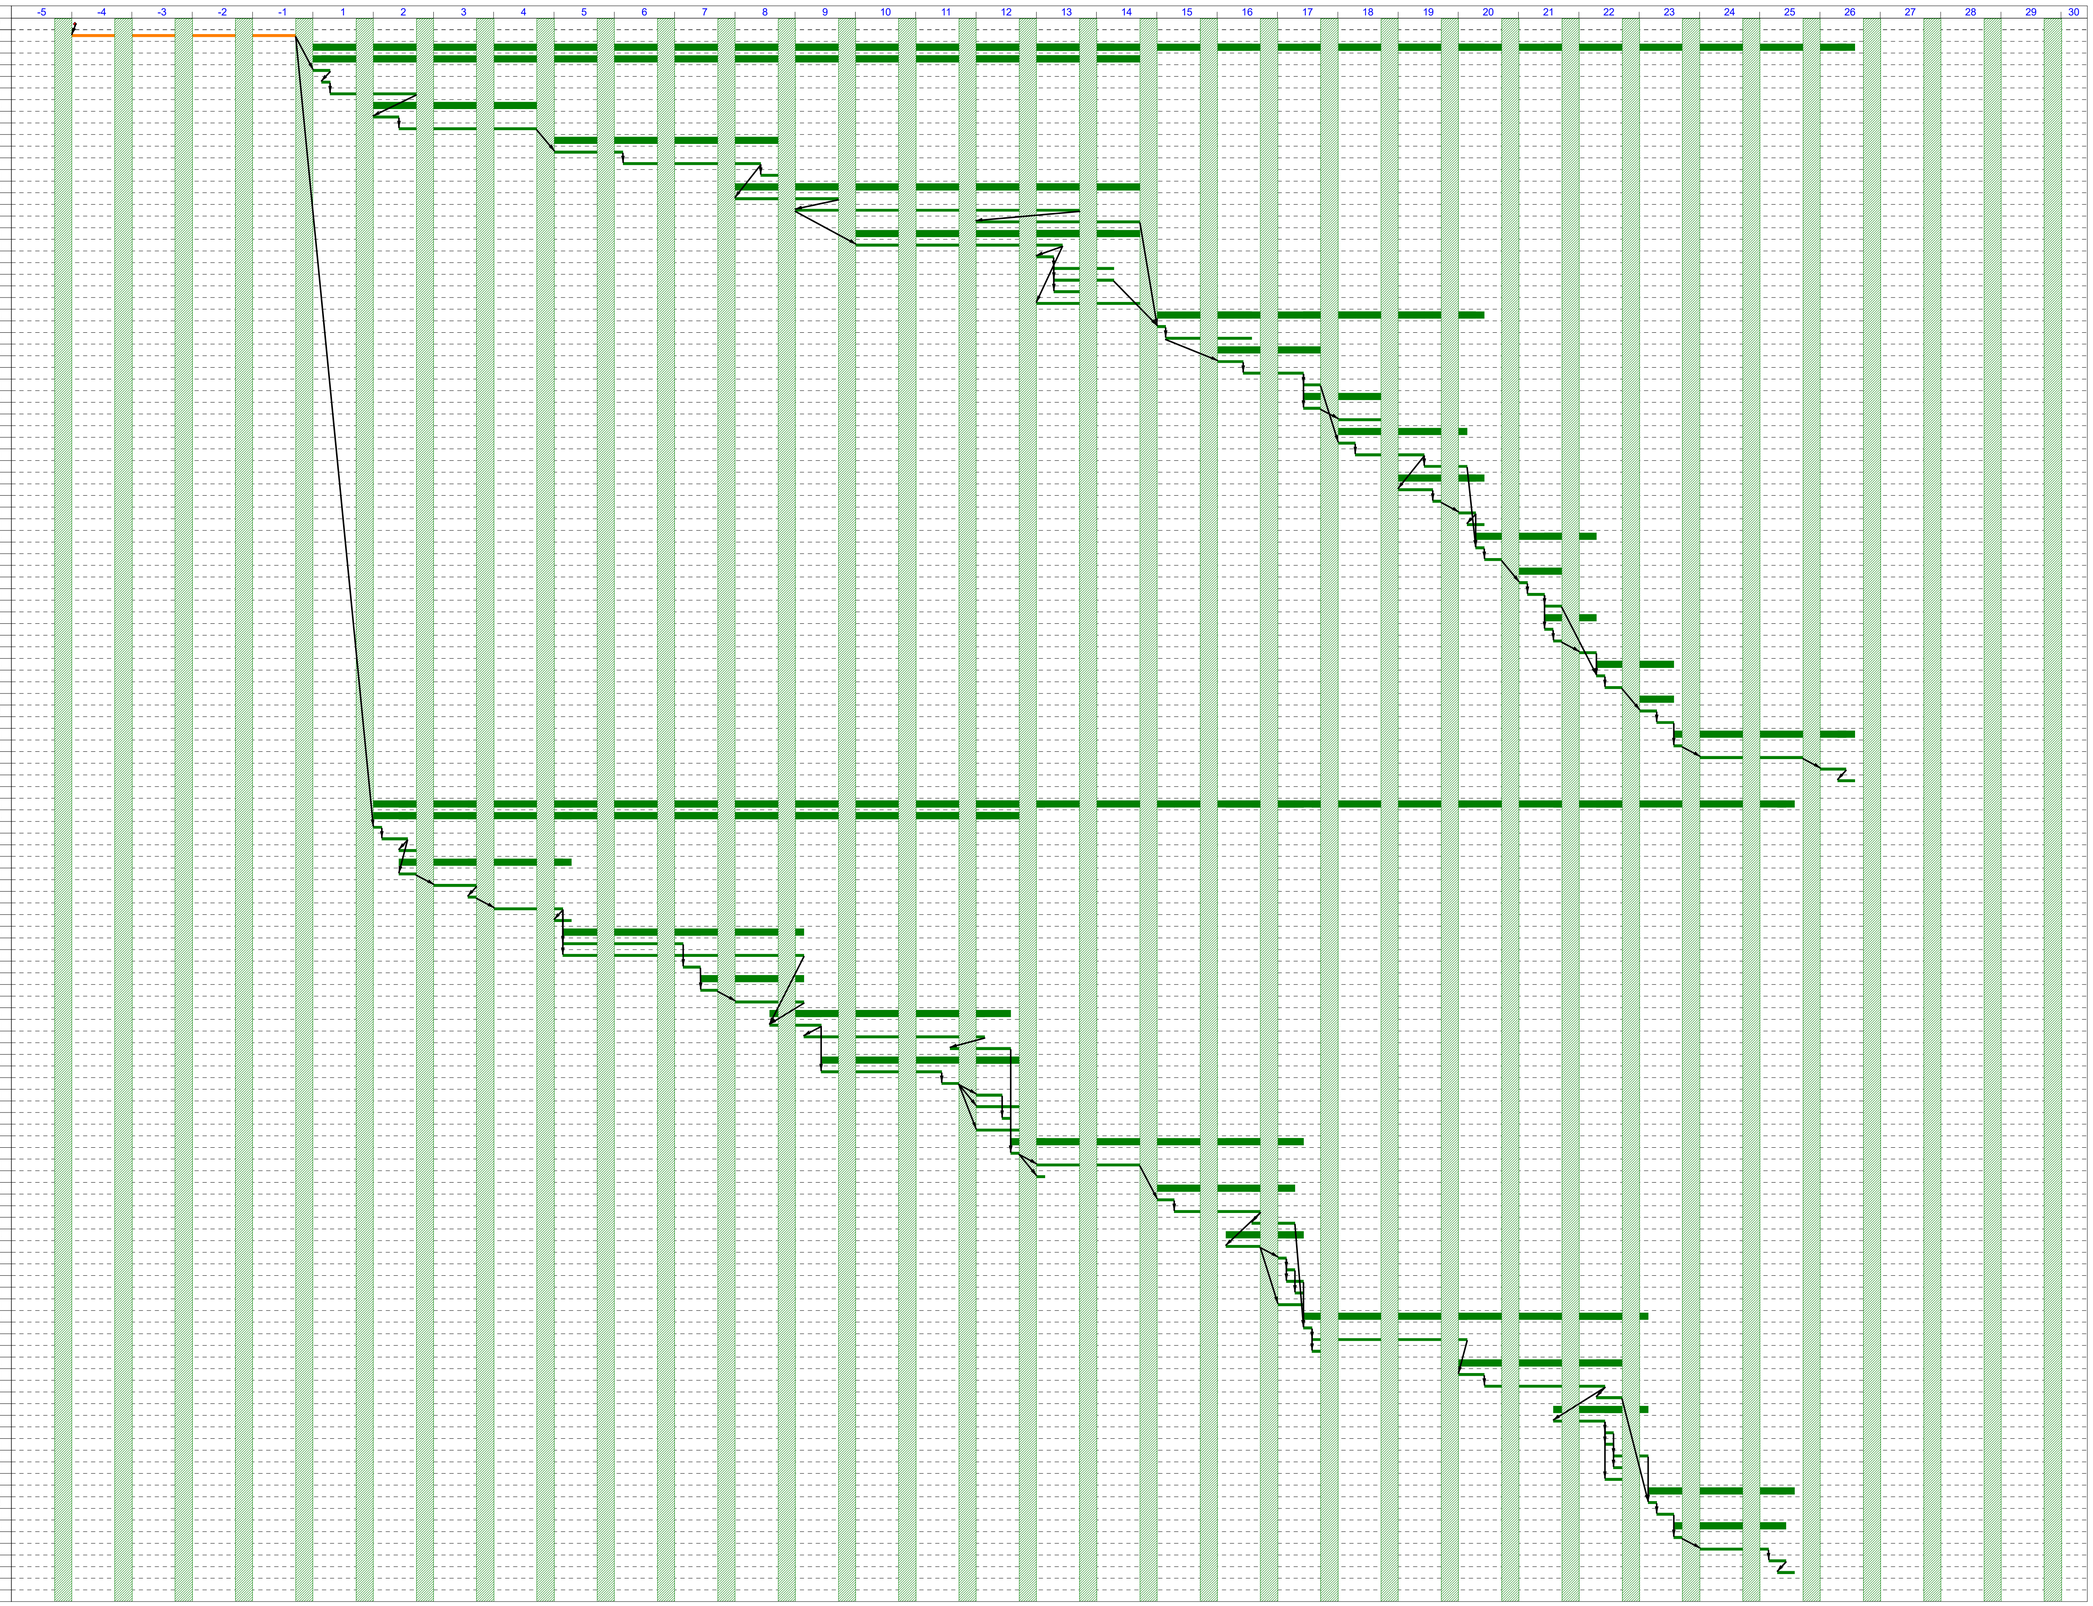
ID	Name	Start	Duration	Finish
1	Notice of Award	11/12/23	0d	11/12/23
2	Mobilisation	11/12/23	20d	05/01/24
3	High Common Road	08/01/24	129d	04/07/24
4	Area 1	**08/01/24**	**70d**	**12/04/24**
5	Site Establishment	08/01/24	2d	09/01/24
6	Traffic Management	09/01/24	1d	09/01/24
7	Site Clearance	10/01/24	8d	19/01/24
8	**Earthworks**	**15/01/24**	**15d**	**02/02/24**
9	Topsoil	15/01/24	3d	17/01/24
10	Cut/Fill	18/01/24	12d	02/02/24
11	**Surface Water Drainage**	**05/02/24**	**20d**	**01/03/24**
12	Manholes - 2G	05/02/24	6d	12/02/24
13	Pipework - 2G	13/02/24	12d	28/02/24
14	Gullys	29/02/24	2d	01/03/24
15	**Road Construction**	**26/02/24**	**35d**	**12/04/24**
16	Type 1 Sub-base	26/02/24	10d	08/03/24
17	Kerbs/Channels - 2G	04/03/24	25d	05/04/24
18	Tarmac	25/03/24	15d	12/04/24
19	**Footpath/RAB border**	**11/03/24**	**25d**	**12/04/24**
20	Edging	11/03/24	18d	03/04/24
21	Type 1 Sub-base	01/04/24	2d	02/04/24
22	Block Paving	03/04/24	5d	09/04/24
23	Tarmac	03/04/24	5d	09/04/24
24	Tactiles	03/04/24	3d	05/04/24
25	Grass Verge	01/04/24	10d	12/04/24
26	**Area 2**	**15/04/24**	**28d**	**22/05/24**
27	Traffic Management	15/04/24	1d	15/04/24
28	Site Clearance	16/04/24	8d	25/04/24
29	**Attenuation Tank**	**22/04/24**	**10d**	**03/05/24**
30	Excavation & Preparation	22/04/24	3d	24/04/24
31	Installation	25/04/24	5d	01/05/24
32	Backfill	02/05/24	2d	03/05/24
33	**Surface Drainage**	**02/05/24**	**7d**	**10/05/24**
34	Gullys & Manholes	02/05/24	2d	03/05/24
35	Pipework	06/05/24	5d	10/05/24
36	**Road Construction**	**06/05/24**	**11d**	**20/05/24**
37	Type 1 Sub-base	06/05/24	2d	07/05/24
38	Kerbs/Channels	08/05/24	6d	15/05/24
39	Tarmac	16/05/24	3d	20/05/24
40	**Footpath**	**13/05/24**	**8d**	**22/05/24**
41	Edging	13/05/24	4d	16/05/24
42	Type 1 Sub-base	17/05/24	1d	17/05/24
43	Tarmac	20/05/24	2d	21/05/24
44	Grass Verge	21/05/24	2d	22/05/24
45	**Area 3**	**22/05/24**	**10d**	**04/06/24**
46	Traffic Management	22/05/24	1d	22/05/24
47	Site Clearance	23/05/24	2d	24/05/24
48	**Road Construction**	**27/05/24**	**5d**	**31/05/24**
49	Type 1 Sub-base	27/05/24	1d	27/05/24
50	Kerbs/Channels	28/05/24	2d	29/05/24
51	Tarmac	30/05/24	2d	31/05/24
52	**Footpaths**	**30/05/24**	**4d**	**04/06/24**
53	Edgings	30/05/24	1d	30/05/24
54	Type 1 Sub-base	31/05/24	1d	31/05/24
55	Tarmac	03/06/24	2d	04/06/24
56	**Area 4**	**05/06/24**	**7d**	**13/06/24**
57	Traffic Management	05/06/24	1d	05/06/24
58	Site Clearance	06/06/24	2d	07/06/24
59	**Road Construction**	**10/06/24**	**4d**	**13/06/24**
60	Type 1 Sub-base	10/06/24	2d	11/06/24
61	Tarmac	12/06/24	2d	13/06/24
62	**Area 5**	**14/06/24**	**15d**	**04/07/24**
63	Traffic Management	14/06/24	1d	14/06/24
64	Surfacing	17/06/24	10d	28/06/24
65	Road Marking	01/07/24	3d	03/07/24
66	Clear Site & Snags	03/07/24	2d	04/07/24
67				
68	**Barugh Green Road**	**15/01/24**	**119d**	**27/06/24**
69	**Area 1**	**15/01/24**	**55d**	**29/03/24**
70	Site Establishment	15/01/24	1d	15/01/24
71	Site Clearance	16/01/24	3d	18/01/24
72	Excavate footpath & kerbs	18/01/24	2d	19/01/24
73	**Earthworks**	**18/01/24**	**14d**	**06/02/24**
74	Topsoil	18/01/24	2d	19/01/24
75	Cut/Fill	22/01/24	5d	26/01/24
76	Trial Holes	26/01/24	1d	26/01/24
77	Turnover	29/01/24	6d	05/02/24
78	Geogrid Stitching	05/02/24	2d	06/02/24
79	**Surface Drainage**	**06/02/24**	**20d**	**04/03/24**
80	Manholes	06/02/24	10d	19/02/24
81	Pipework	06/02/24	20d	04/03/24
82	Gullys	20/02/24	2d	21/02/24
83	**Foul Drainage**	**22/02/24**	**8d**	**04/03/24**
84	Manholes	22/02/24	2d	23/02/24
85	Pipework	26/02/24	6d	04/03/24
86	**Road Construction**	**01/03/24**	**20d**	**28/03/24**
87	Type 1 Sub-base	01/03/24	4d	06/03/24
88	Kerbs/Channels	05/03/24	15d	25/03/24
89	Tarmac	22/03/24	5d	28/03/24
90	**Footpath/RAB border**	**07/03/24**	**17d**	**29/03/24**
91	Edging	07/03/24	10d	20/03/24
92	Type 1 Sub-base	21/03/24	2d	22/03/24
93	Block Paving	25/03/24	3d	27/03/24
94	Tarmac	25/03/24	5d	29/03/24
95	Tactiles	28/03/24	1d	28/03/24
96	Grass Verge	25/03/24	5d	29/03/24
97	**Area 2**	**29/03/24**	**24d**	**01/05/24**
98	Traffic Management	29/03/24	1d	29/03/24
99	Site Clearance	01/04/24	10d	12/04/24
100	Surface Drainage	01/04/24	1d	01/04/24
101	**Road Construction**	**15/04/24**	**12d**	**30/04/24**
102	Type 1 Sub-base	15/04/24	2d	16/04/24
103	Kerbs/Channels	17/04/24	8d	26/04/24
104	Tarmac	26/04/24	3d	30/04/24
105	**Footpath/RAB border**	**23/04/24**	**7d**	**01/05/24**
106	Edging	23/04/24	4d	26/04/24
107	Type 1 Sub-base	29/04/24	1d	29/04/24
108	Block Paving	30/04/24	1d	30/04/24
109	Tarmac	30/04/24	2d	01/05/24
110	Tactiles	01/05/24	1d	01/05/24
111	Grass Verge	29/04/24	3d	01/05/24
112	**Area 3**	**02/05/24**	**28d**	**10/06/24**
113	Traffic Management	02/05/24	1d	02/05/24
114	Site Clearance	03/05/24	12d	20/05/24
115	Surface Drainage	03/05/24	1d	03/05/24
116	**Road Construction**	**20/05/24**	**15d**	**07/06/24**
117	Type 1 Sub-base	20/05/24	3d	22/05/24
118	Kerbs/Channels	23/05/24	10d	05/06/24
119	Tarmac	05/06/24	3d	07/06/24
120	**Footpath/RAB border**	**31/05/24**	**7d**	**10/06/24**
121	Edging	31/05/24	4d	05/06/24
122	Type 1 Sub-base	06/06/24	1d	06/06/24
123	Block Paving	06/06/24	1d	06/06/24
124	Tarmac	07/06/24	2d	10/06/24
125	Tactiles	07/06/24	1d	07/06/24
126	Grass Verge	06/06/24	2d	07/06/24
127	**Area 4**	**11/06/24**	**13d**	**27/06/24**
128	Traffic Management	11/06/24	1d	11/06/24
129	Site Clearance	12/06/24	2d	13/06/24
130	**Road Construction**	**14/06/24**	**9d**	**26/06/24**
131	Type 1 Sub-base	14/06/24	1d	14/06/24
132	Tarmac	17/06/24	6d	24/06/24
133	Road Lining	25/06/24	2d	26/06/24
134	Clear Site & Snags	26/06/24	2d	27/06/24
135				
136
